

ビジョン指標の進捗一覧(下水道事業)

方針	目標	指標名	令和元年度	現状 (令和2年度)	中間目標値 (令和5年度)	最終目標値 (令和10年度)
快適	下水道普及率の向上	下水道普及率	91.5%	91.7%	92.7%	95.5%
		生活排水処理率	95.1%	95.4%	97.6%	100%
	良質な水環境の確保	水洗化率	95.8%	96.1%	97.6%	100%
安心	災害への備え	雨水整備率	46%	47%	48%	51%
		ポンプ場の耐震評価診断	未実施	一部実施	一部実施	実施
		上下水道BCPに基づく訓練の実施回数	2回/年	2回/年	2回以上/年	2回以上/年
	管渠・施設の機能維持	管渠の巡視点検の実施回数	1回/5年間の距離の巡視点検を実施	1回/5年間の距離の巡視点検を実施	1回以上/5年間	2回以上/10年間
		陥没事故件数	0件	0件	0件	0件
持続	持続可能な経営	経常収支比率	114.8%	109.6%	100%以上	100%以上
		経費回収率	111.6%	116.5%	100%以上	100%以上
	お客さまとのコミュニケーション	広報誌発行回数	1回/年	2回/年	2回/年	2回/年
		アンケートの実施	1回/年	2回/年	定期的に実施	定期的に実施

公共下水道整備年次計画図

令和1年度～令和5年度
志方地区外公共下水道整備事業(第1工区)

原第6工区污水管渠布設工事

横大路第9工区污水管渠布設工事

上富木第16工区污水管渠布設工事

大國第16工区污水管渠布設工事

砂部第11工区污水管渠布設工事

養老第7工区污水管渠布設工事

小野第7工区污水管渠布設工事



大野第4工区污水管渠布設工事

新在家第21工区污水管渠布設工事

凡 例	
■	前期 (H28～H30)
■	中期 (H31～H34)
■	後期 (H35～H37)
■	整備済み
	公共下水道区域
	町界

○ : 令和2年度施工箇所

下水道(雨水) 整備箇所図

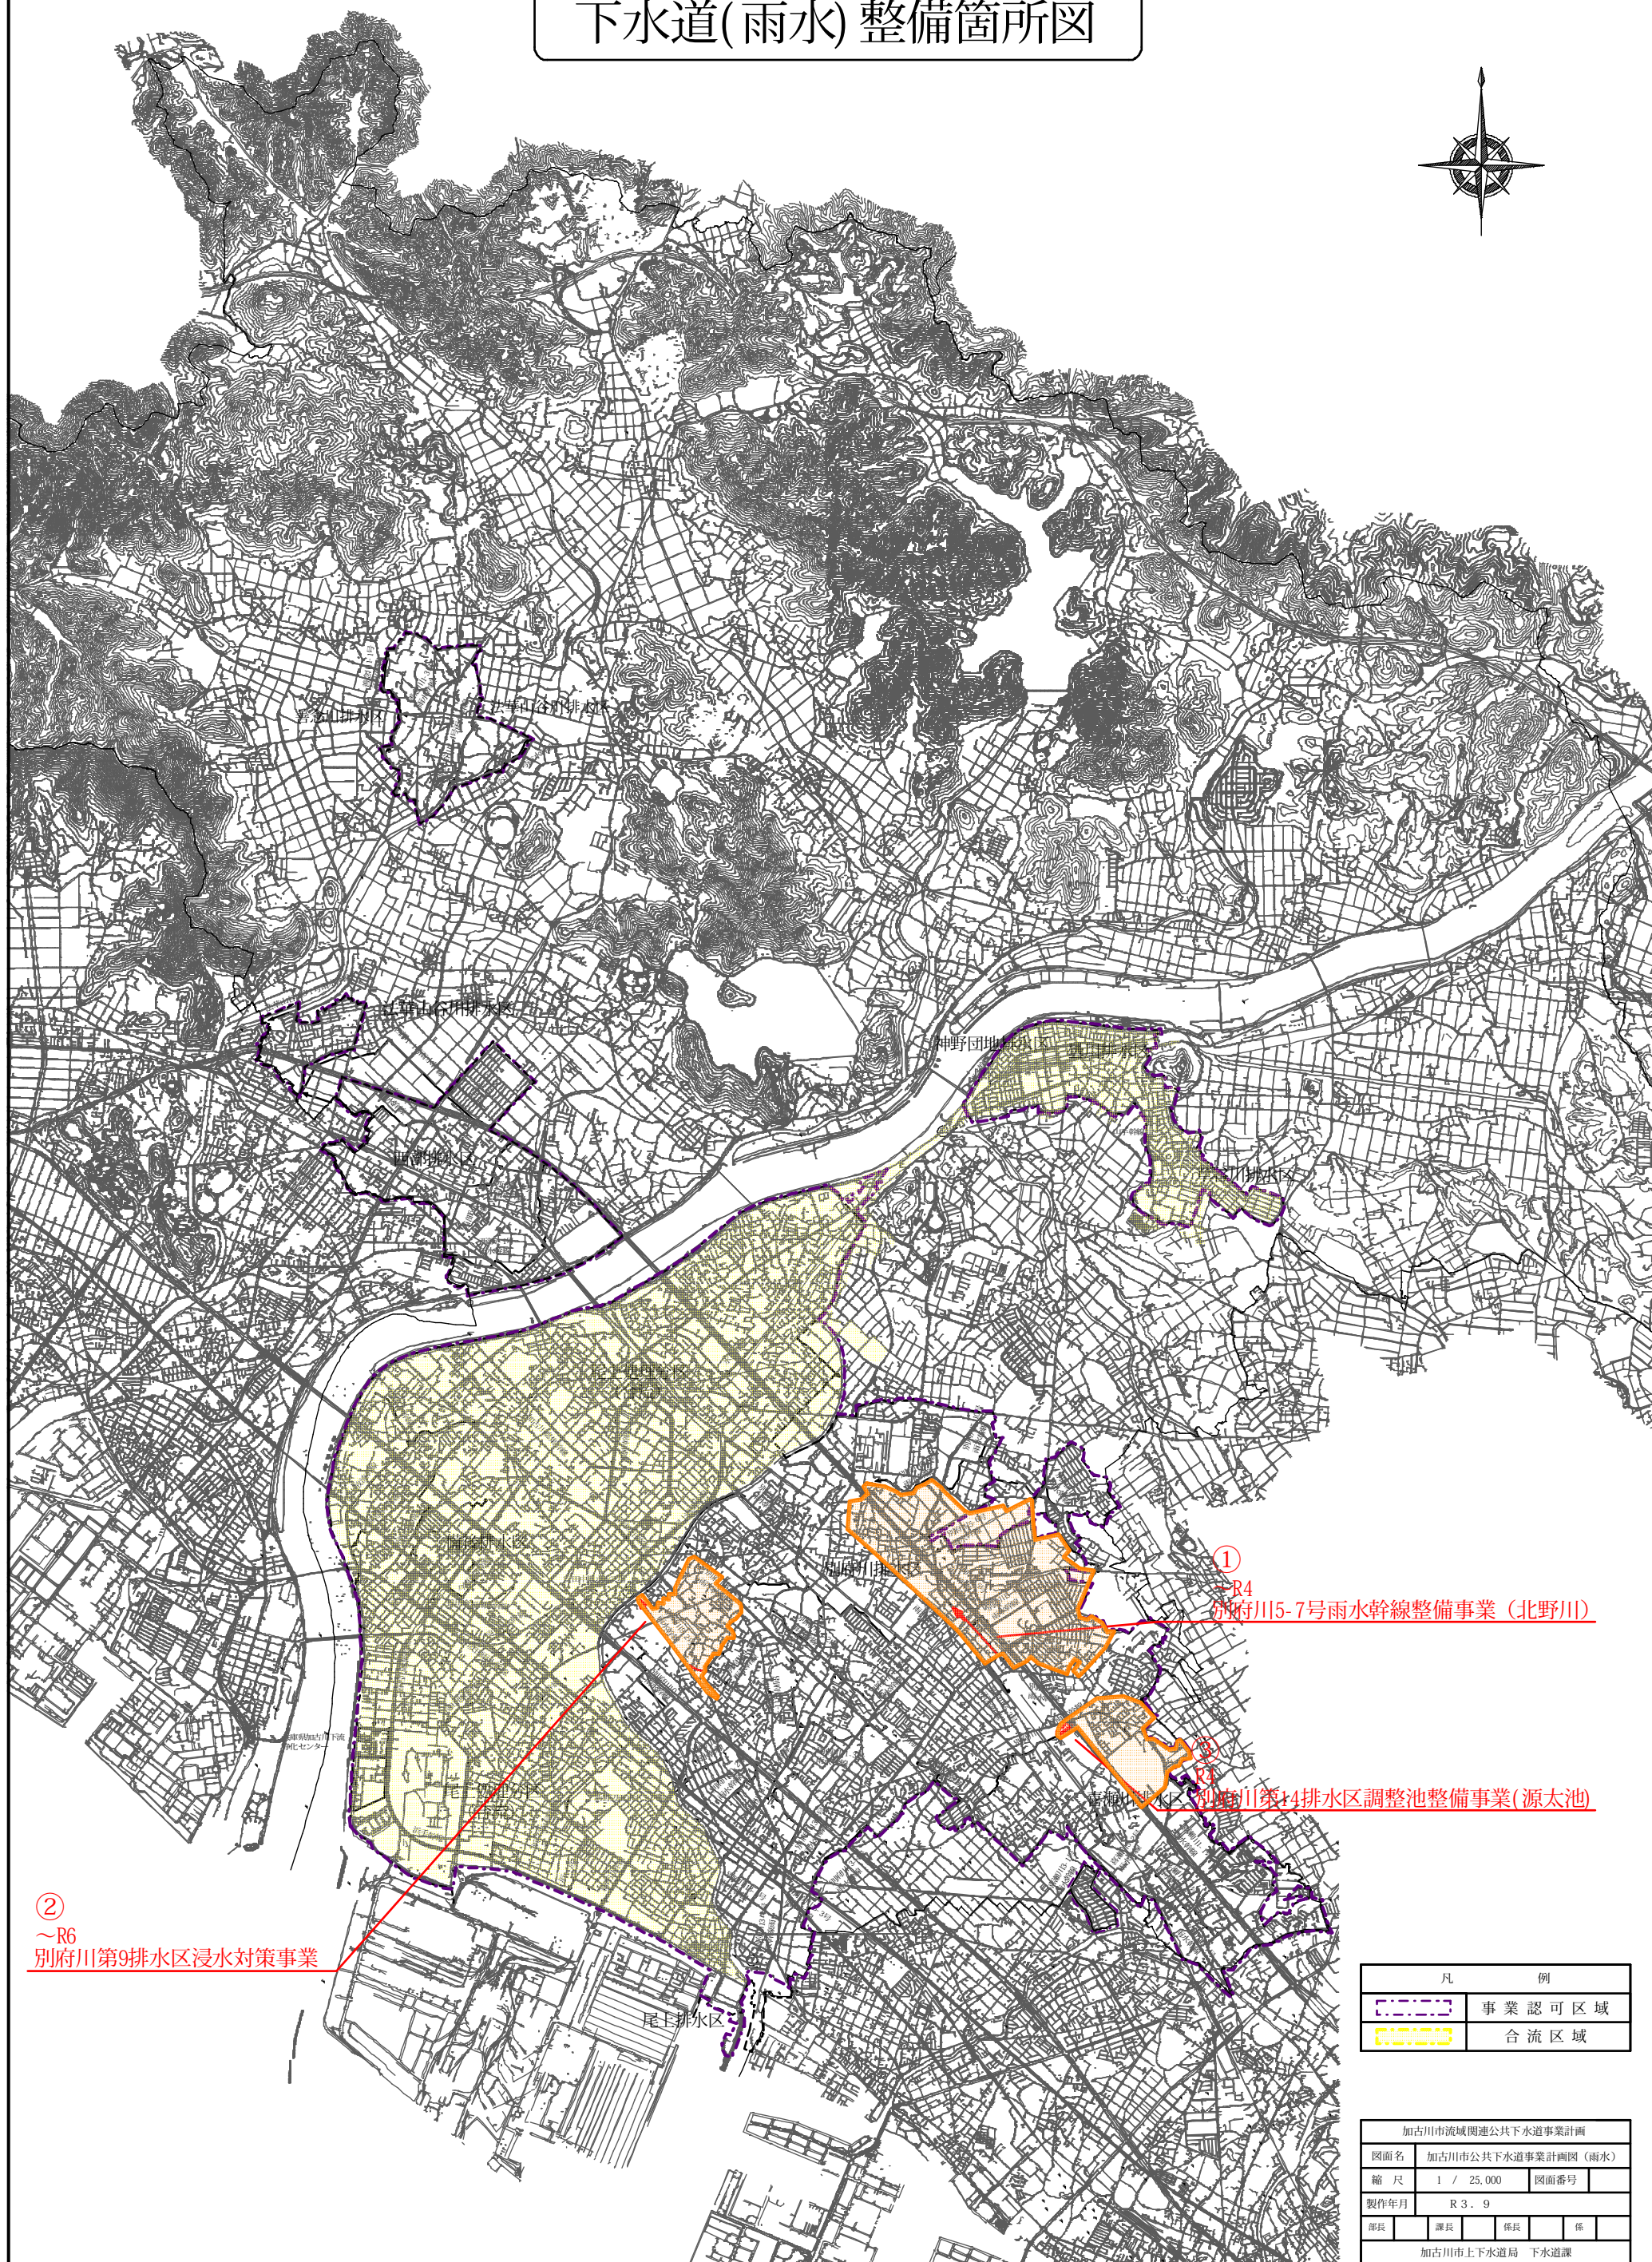


凡	例
	事業認可区域
	合流区域


加古川市流域関連公共下水道事業計画			
図面名	加古川市公共下水道事業計画図(雨水)		
縮 尺	1 / 25,000	図面番号	
製作年月	R 3 . 9		
部長	課長	係長	係
加古川市上下水道局 下水道課			



ポンプ場位置図（耐震）

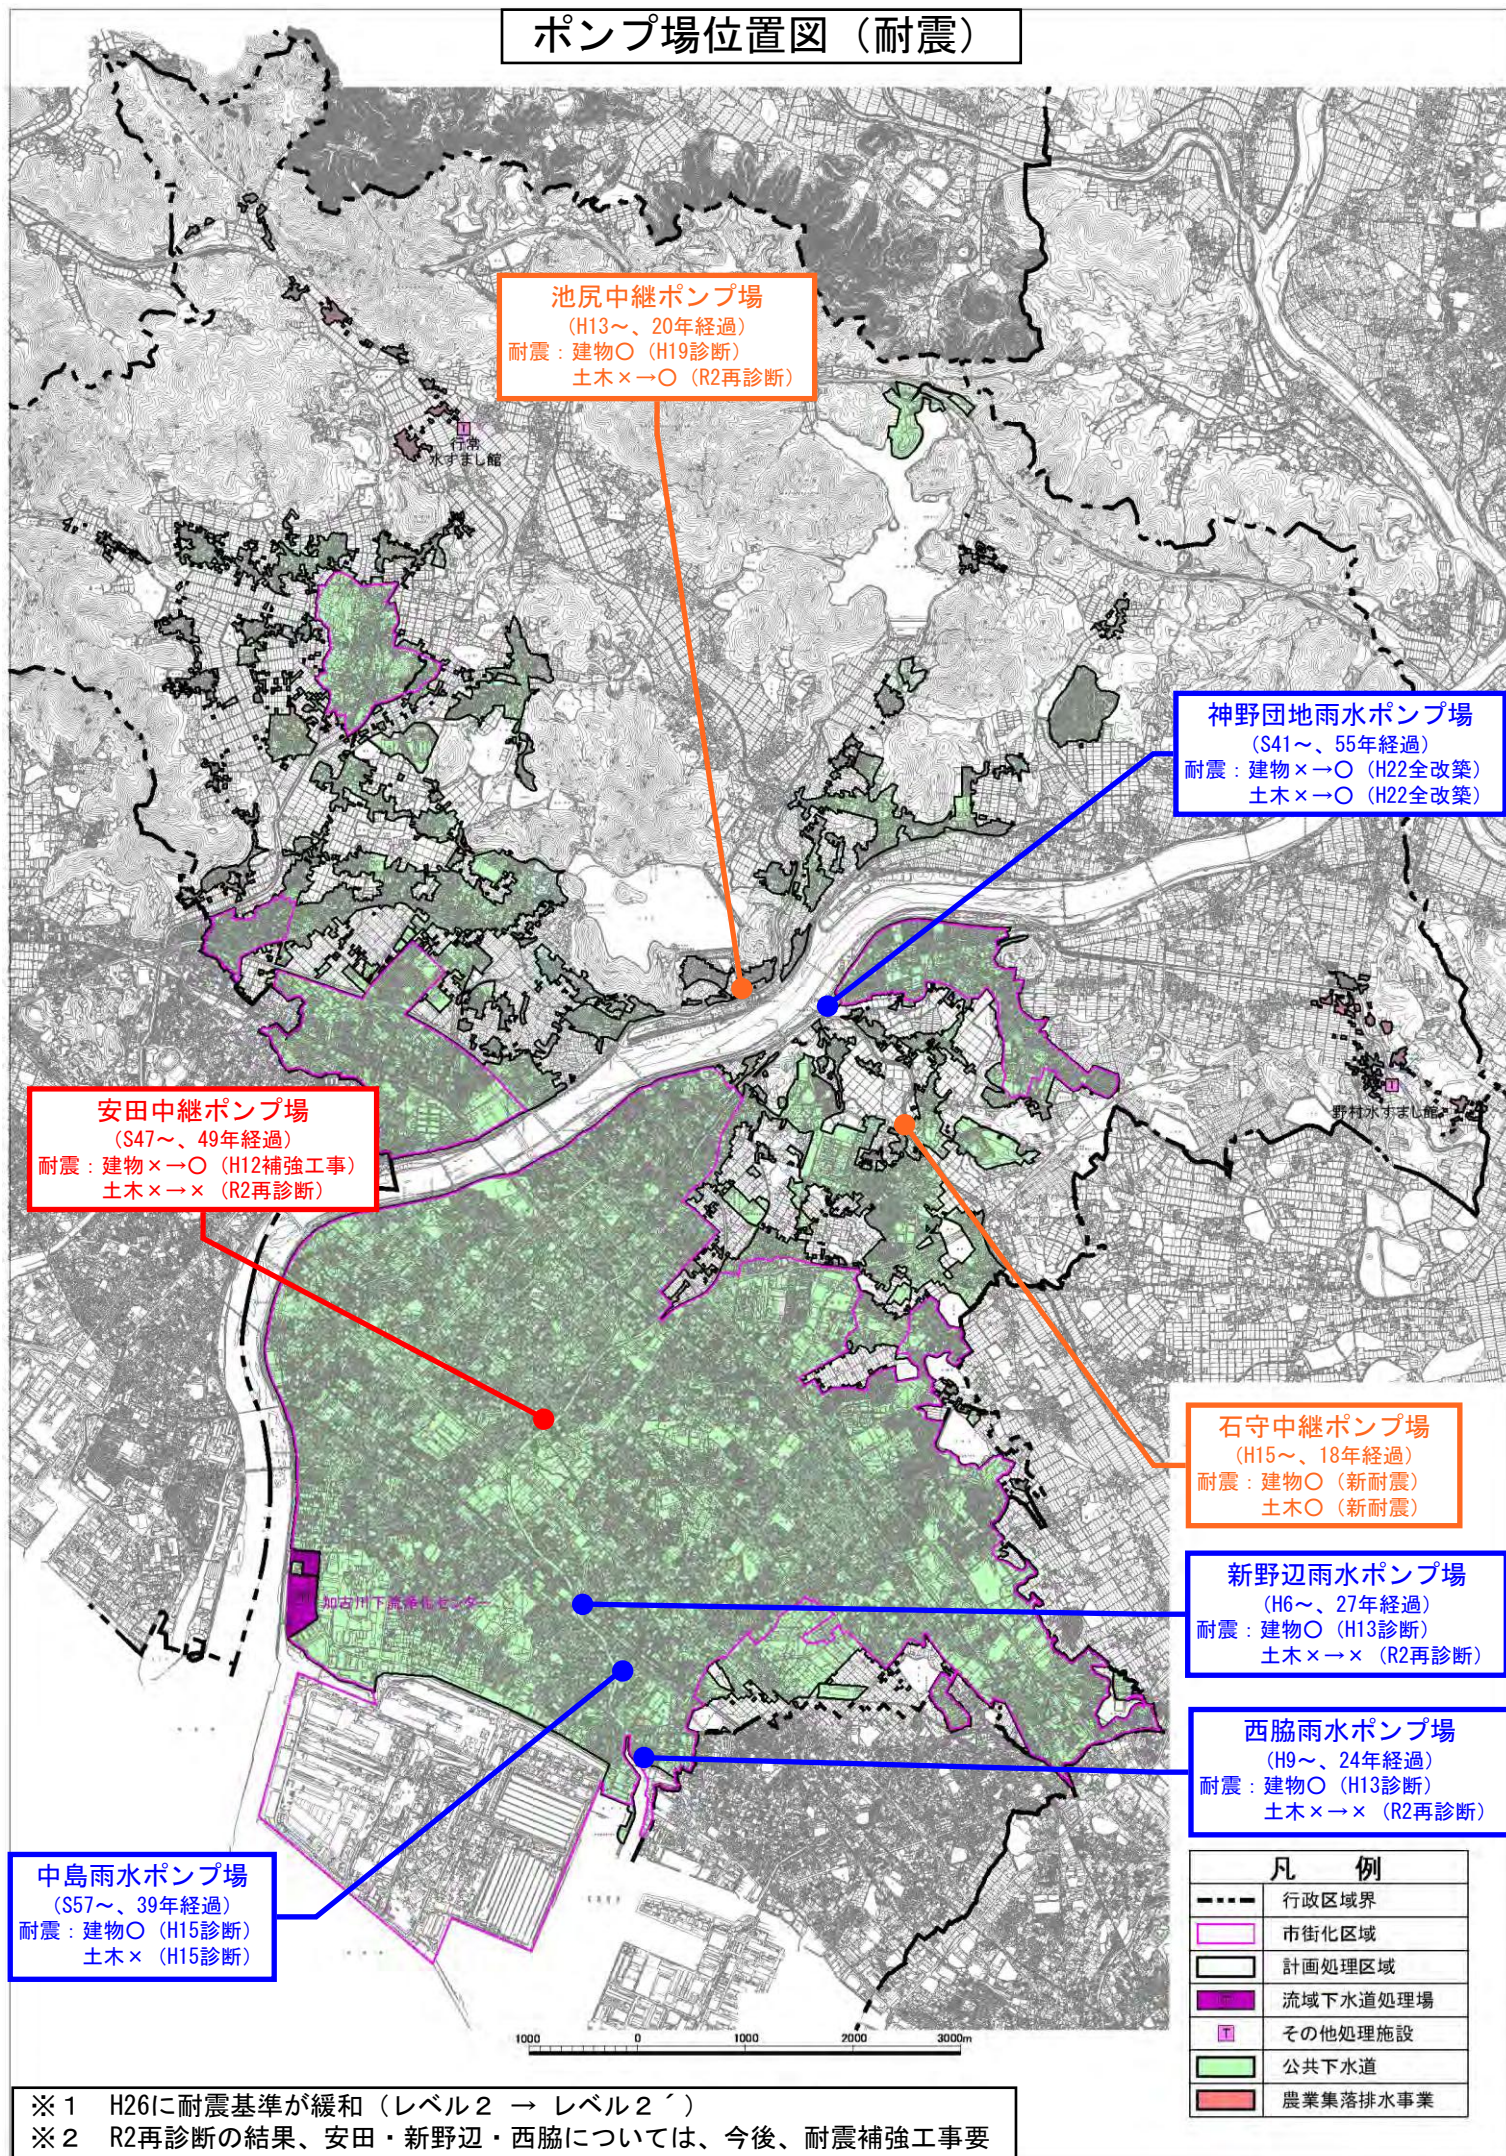

加古川市巡視点検調査 図郭割図

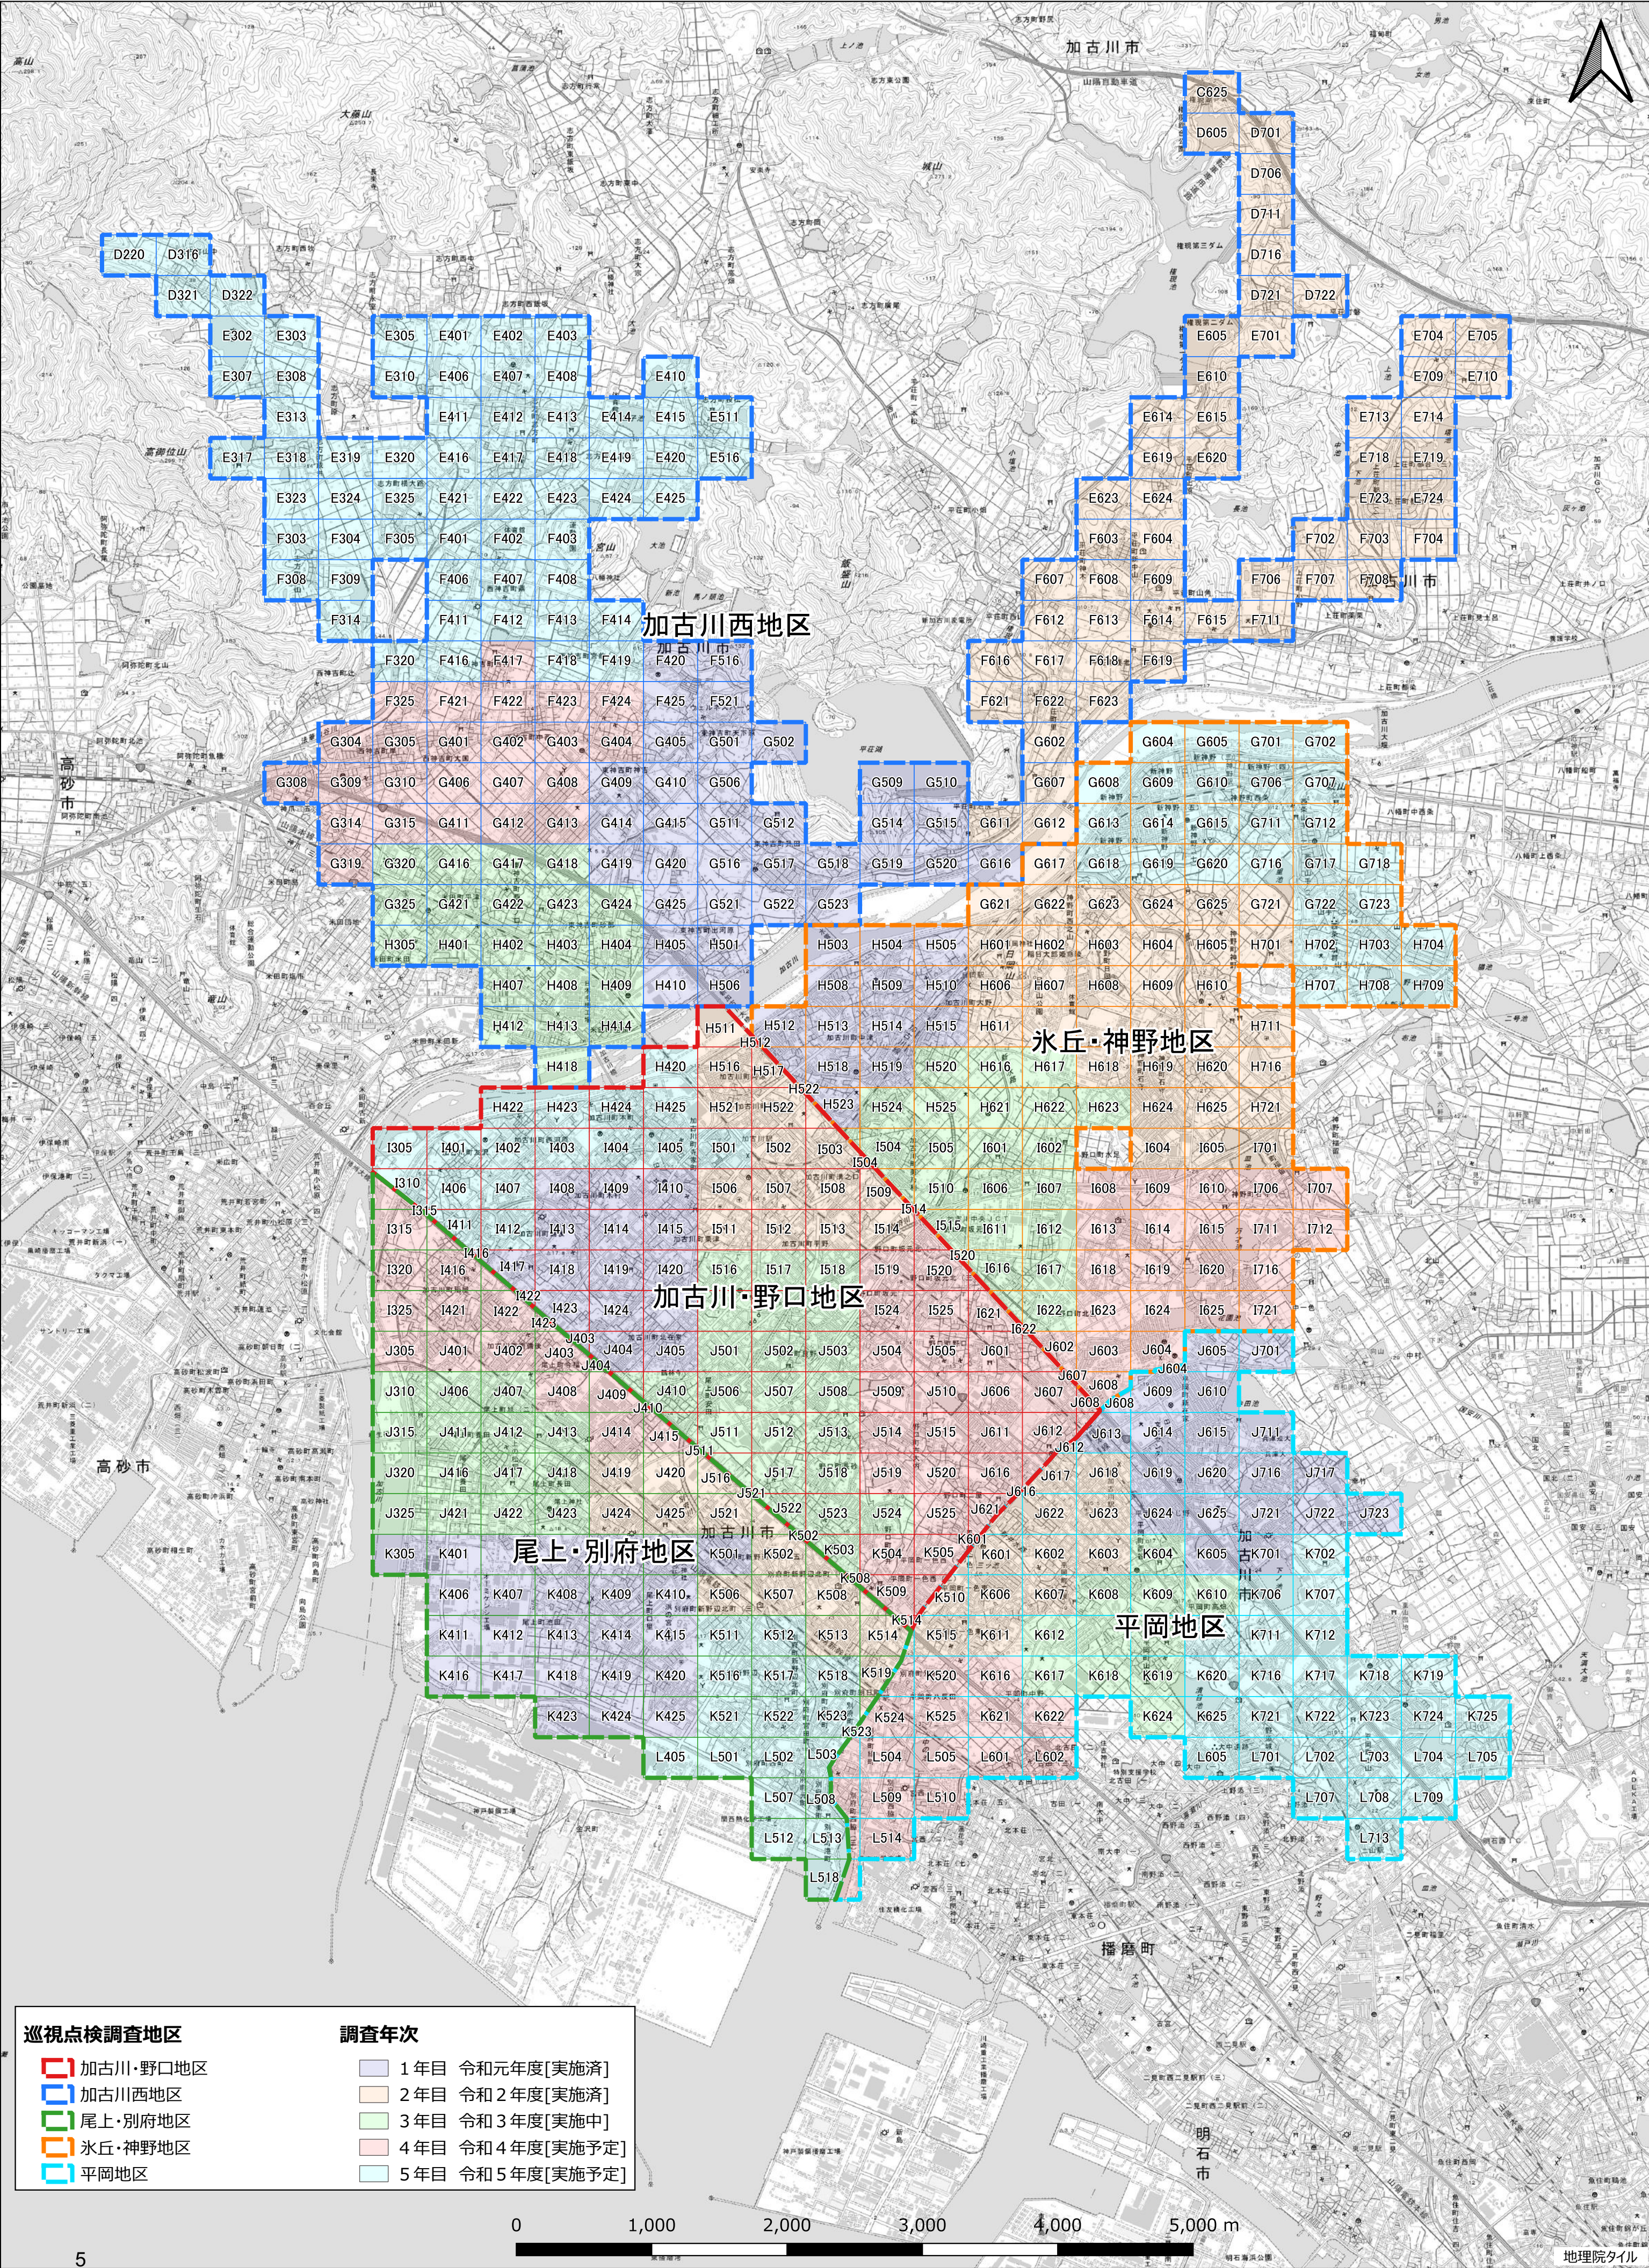

調査日: 2020年8月17日

巡視・点検調査 記録表

(調査対象人孔)


上流側人孔	メッシュ番号 G611	人孔番号 101
-------	-------------	----------

下流側人孔	メッシュ番号 G611	人孔番号 2
-------	-------------	--------

管渠等 基礎情報	排除方式	汚水(分流)
	区間延長	4.27
	管種・径	HP250

人孔 基礎情報	人孔の規格	1号マンホール
	蓋の耐荷重	T-14
	設置年度	2008年


全景

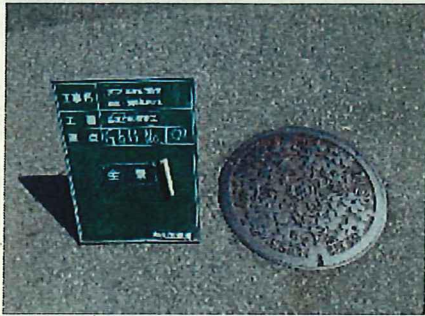

近景




写真(蓋裏面)

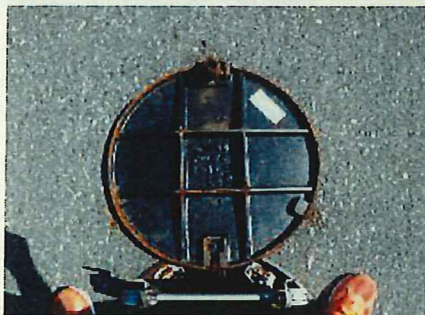

人孔内部(上部より)



損傷、異常個所(1)

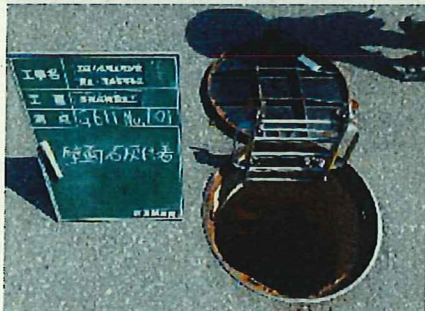

損傷、異常個所(2)



	評価	備考
目視調査 必要性	△	○: 特に目立った損傷、異常がなく、目視調査を実施する必要がない施設 △: 少し損傷、異常がみられ、市監督員との協議が必要な施設 ×: 損傷、異常がみられる、もしくは異常がある可能性が高く、目視調査を実施する必要がある施設
目視調査が必要と 判断した理由	⑧	①: 路面の亀裂、沈下、陥没 ②: 蓋の摩耗、がたつき、破損・クラック ③: 蓋と受枠間の段差 ④: 人孔躯体部の損傷 ⑤: 人孔躯体部への侵入水 ⑥: 人孔内の堆積(土砂・油脂等) ⑦: 上・下流管口の損傷 ⑧: その他
自由記述	壁面石灰付着	
